



# REGIONE PUGLIA

## COMUNE DI TORCHIAROLO



### Progetto esecutivo per la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri Lungomare Torre San Gennaro e Lendinuso

#### PROGETTO

##### Ufficio Tecnico

Ing. Daniele Gravili  
Geom. Vincenzo Tondo

##### Progettazione specialistica

RTP  ASTRA ENGINEERING S.r.l. (capogruppo)  
Ing. Alberto De Pascalis

Dott.ssa Geol. Raffaella De Pascalis

Ing. Alberto Romano

##### Consulenza Geologica

Dott.ssa Geol. Ilaria Maggiulli



#### COMMITTENTE

##### COMUNE DI TORCHIAROLO (BR)

R.U.P.

Geom. Celerina Pileggi

ELABORATO

TITOLO ELABORATO

All. 8


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data: Novembre 2016

Rev: 1<sup>a</sup> emissione

Cronoprogramma dei lavori

Tempo complessivo stimato pari a 450 Giorni naturali e consecutivi

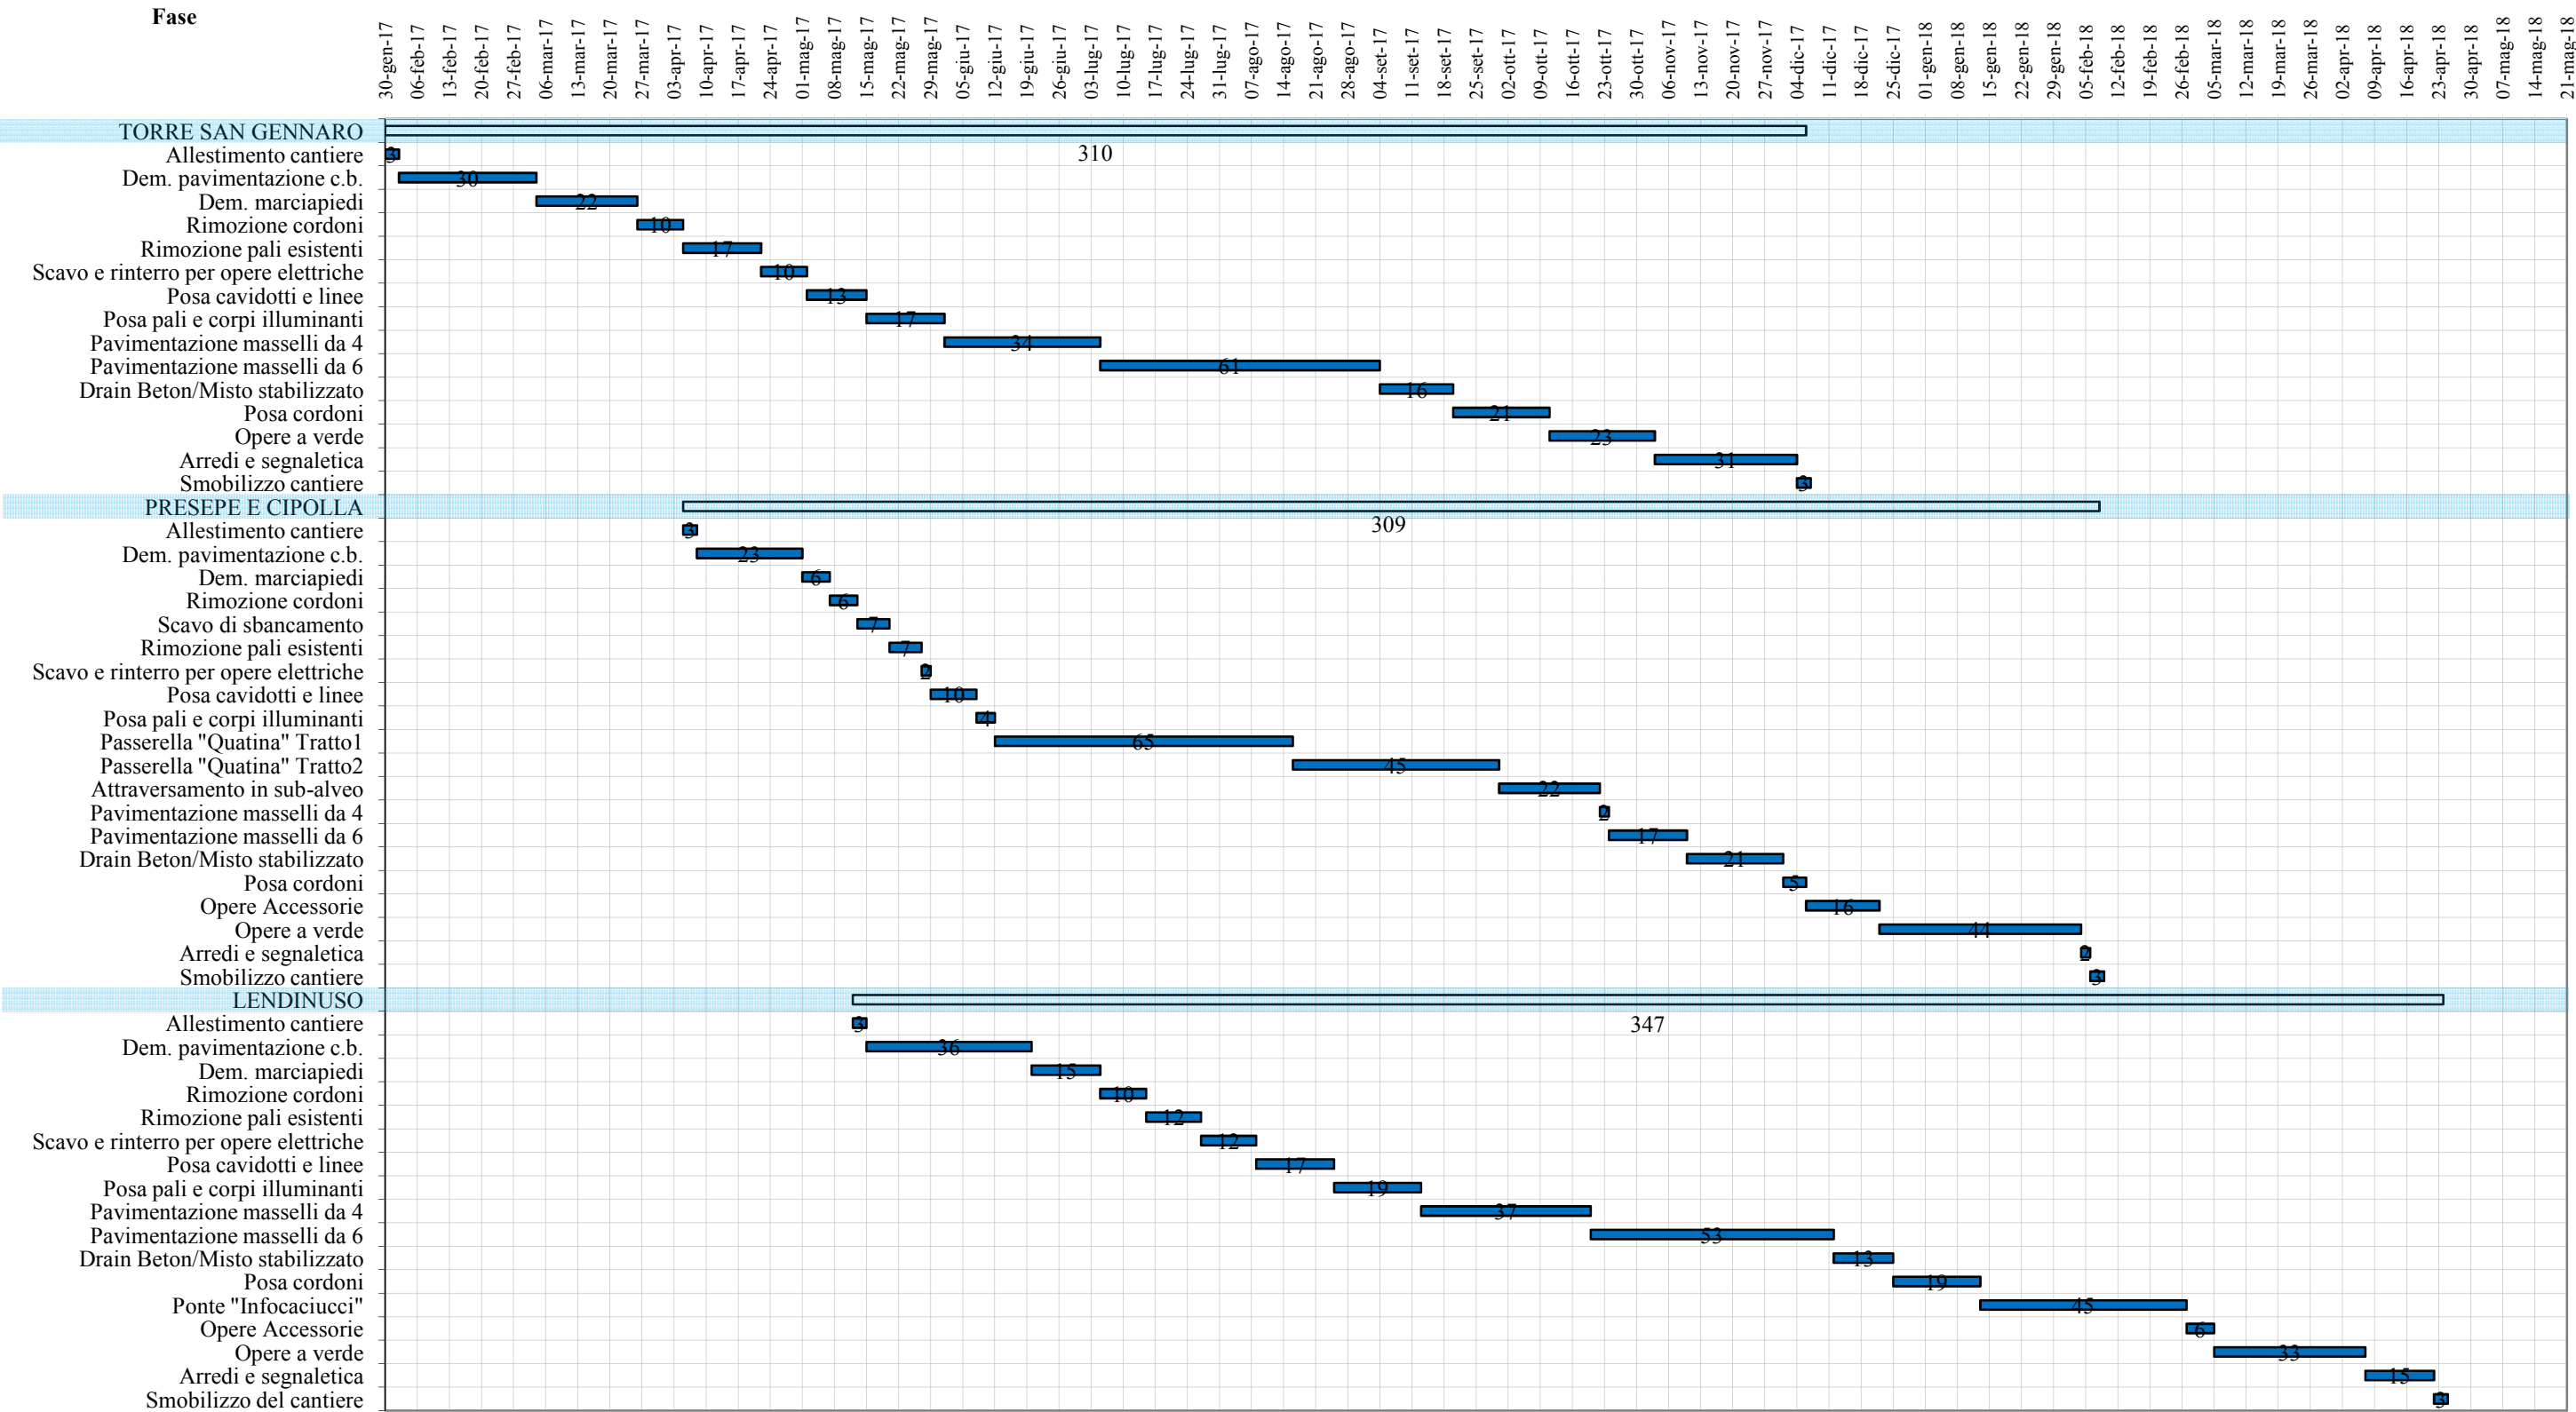

**COMUNE DI TORCHIAROLO - PROGETTO ESECUTIVO PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI LUNGOMARE TORRE SAN GENNARO - LENDINUSO**

|          |                                       | DURATA LAVORI (Data) |                   |            |
|----------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| n.° fase | Descrizione Fase                      | Inizio               | Fine              | Durata     |
| <b>A</b> | <b>TORRE SAN GENNARO</b>              | <b>30/01/2017</b>    | <b>06/12/2017</b> | <b>310</b> |
| 0        | Allestimento cantiere                 | 30/01/2017           | 01/02/2017        | 3          |
| 1        | Dem. pavimentazione c.b.              | 02/02/2017           | 03/03/2017        | 30         |
| 2        | Dem. marciapiedi                      | 04/03/2017           | 25/03/2017        | 22         |
| 3        | Rimozione cordoni                     | 26/03/2017           | 04/04/2017        | 10         |
| 4        | Rimozione pali esistenti              | 05/04/2017           | 21/04/2017        | 17         |
| 5        | Scavo e rinterro per opere elettriche | 22/04/2017           | 01/05/2017        | 10         |
| 6        | Posa cavidotti e linee                | 02/05/2017           | 14/05/2017        | 13         |
| 7        | Posa pali e corpi illuminanti         | 15/05/2017           | 31/05/2017        | 17         |
| 8        | Pavimentazione masselli da 4          | 01/06/2017           | 04/07/2017        | 34         |
| 9        | Pavimentazione masselli da 6          | 05/07/2017           | 03/09/2017        | 61         |
| 10       | Drain Beton/Misto stabilizzato        | 04/09/2017           | 19/09/2017        | 16         |
| 11       | Posa cordoni                          | 20/09/2017           | 10/10/2017        | 21         |
| 12       | Opere a verde                         | 11/10/2017           | 02/11/2017        | 23         |
| 13       | Arredi e segnaletica                  | 03/11/2017           | 03/12/2017        | 31         |
| 14       | Smobilizzo cantiere                   | 04/12/2017           | 06/12/2017        | 3          |
| <b>B</b> | <b>PRESEPE E CIPOLLA</b>              | <b>05/04/2017</b>    | <b>08/02/2018</b> | <b>309</b> |
| 0        | Allestimento cantiere                 | 05/04/2017           | 07/04/2017        | 3          |
| 1        | Dem. pavimentazione c.b.              | 08/04/2017           | 30/04/2017        | 23         |
| 2        | Dem. marciapiedi                      | 01/05/2017           | 06/05/2017        | 6          |
| 3        | Rimozione cordoni                     | 07/05/2017           | 12/05/2017        | 6          |
| 4        | Scavo di sbancamento                  | 13/05/2017           | 19/05/2017        | 7          |
| 5        | Rimozione pali esistenti              | 20/05/2017           | 26/05/2017        | 7          |
| 6        | Scavo e rinterro per opere elettriche | 27/05/2017           | 28/05/2017        | 2          |
| 7        | Posa cavidotti e linee                | 29/05/2017           | 07/06/2017        | 10         |
| 8        | Posa pali e corpi illuminanti         | 08/06/2017           | 11/06/2017        | 4          |
| 9        | Passerella "Quatina" Tratto1          | 12/06/2017           | 15/08/2017        | 65         |
| 10       | Passerella "Quatina" Tratto2          | 16/08/2017           | 29/09/2017        | 45         |
| 11       | Attraversamento in sub-alveo          | 30/09/2017           | 21/10/2017        | 22         |
| 12       | Pavimentazione masselli da 4          | 22/10/2017           | 23/10/2017        | 2          |
| 13       | Pavimentazione masselli da 6          | 24/10/2017           | 09/11/2017        | 17         |
| 14       | Drain Beton/Misto stabilizzato        | 10/11/2017           | 30/11/2017        | 21         |
| 15       | Posa cordoni                          | 01/12/2017           | 05/12/2017        | 5          |
| 16       | Opere Accessorie                      | 06/12/2017           | 21/12/2017        | 16         |
| 17       | Opere a verde                         | 22/12/2017           | 03/02/2018        | 44         |
| 18       | Arredi e segnaletica                  | 04/02/2018           | 05/02/2018        | 2          |
| 19       | Smobilizzo cantiere                   | 06/02/2018           | 08/02/2018        | 3          |
| <b>C</b> | <b>LENDINUSO</b>                      | <b>12/05/2017</b>    | <b>24/04/2018</b> | <b>347</b> |
| 0        | Allestimento cantiere                 | 12/05/2017           | 14/05/2017        | 3          |
| 1        | Dem. pavimentazione c.b.              | 15/05/2017           | 19/06/2017        | 36         |
| 2        | Dem. marciapiedi                      | 20/06/2017           | 04/07/2017        | 15         |
| 3        | Rimozione cordoni                     | 05/07/2017           | 14/07/2017        | 10         |
| 4        | Rimozione pali esistenti              | 15/07/2017           | 26/07/2017        | 12         |
| 5        | Scavo e rinterro per opere elettriche | 27/07/2017           | 07/08/2017        | 12         |
| 6        | Posa cavidotti e linee                | 08/08/2017           | 24/08/2017        | 17         |
| 7        | Posa pali e corpi illuminanti         | 25/08/2017           | 12/09/2017        | 19         |
| 8        | Pavimentazione masselli da 4          | 13/09/2017           | 19/10/2017        | 37         |
| 9        | Pavimentazione masselli da 6          | 20/10/2017           | 11/12/2017        | 53         |
| 10       | Drain Beton/Misto stabilizzato        | 12/12/2017           | 24/12/2017        | 13         |
| 11       | Posa cordoni                          | 25/12/2017           | 12/01/2018        | 19         |
| 12       | Ponte "Infocaciucci"                  | 13/01/2018           | 26/02/2018        | 45         |
| 13       | Opere Accessorie                      | 27/02/2018           | 04/03/2018        | 6          |
| 14       | Opere a verde                         | 05/03/2018           | 06/04/2018        | 33         |
| 15       | Arredi e segnaletica                  | 07/04/2018           | 21/04/2018        | 15         |
| 16       | Smobilizzo del cantiere               | 22/04/2018           | 24/04/2018        | 3          |
